

ETAPAS DE EJECUCION DE PLAN DE CONTIGENCIA

Proyecto: “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y LA MEJOR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO – INGEMMET”, CON CUI 2131851” Primera Etapa

Marzo - 2024

Resumen de ejecución de Plan de Contingencia

Fase	Descripción	Inicio	Fin
Primera	Implementación del Teletrabajo	25/03/2024	29/04/2024
Segunda	Acondicionamientos de ambientes y Traslados (archivo UADA y Almacén de Muestras)	25/03/2024	22/04/2024
Tercera	Reubicación de Trabajadores	29/04/2024	17/05/2024
Cuarta	Desmontaje de bienes y equipos para traslado a Depósito tercerizado	24/04/2024	25/07/2024

Primera Fase

Resumen de Puesto Teletrabajables por Dirección

PROYECCIÓN PERSONAL 2024 (DIRECCIONES SEDE LENGUAJE)

Unidad Órgánica	Oficina	Total	CAP	CAS	Autónomos	Practicantes	Trabajo virtual*
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	UADA**	38	3	18	15	2	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	DC	26	2	18	3	3	0
DIRECCION DE DERECHO DE VIGENCIA	DDV	24	2	13	7	2	15
DIRECCION DE CONCESIONES MINERAS	DCM	49	5	35	4	5	31
TOTAL		137					46
* Modalidad a determinar por la Jefatura de Personal							
** UADA tiene personal en las Sedes Canadá y Barton							

PROYECCIÓN PERSONAL 2024 (DIRECCIONES SEDE CANADA)

Unidad Órgánica	Oficina	Total	CAP	CAS	Autónomos	Practicantes	Trabajo virtual*
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO	DGAR	54	6	35	8	5	20
DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	DRME	53	7	35	6	5	32
DIRECCION DE GEOLOGÍA REGIONAL	DGR	35	6	19	5	5	17
TOTAL		142					69

Resumen de Tipo de Conectividad de los Puesto Teletrabajables

Tipo de Conexión	Cantidad	Inicio	Fin
VPN	10	25/03/2024	29/03/2024
Traslado de PC a los Domicilios de los Teletrabajadores	33	01/04/2024	21/04/2024
CITRIX	60	22/04/2024	29/04/2024
Total TELETRABAJO	103		

Resumen de Tipo de Conectividad por Dirección

VPN

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO	
1	DGAR	Lucio Medina Allcca	CAS	GEÓLOGO SENIOR EN PELIGROS GEOLÓGICOS II	
2	DGAR	ROSELL GUEVARA LORENA NICOLE	CAS	ESPECIALISTA EN NEOTECTÓNICA Y PALEOSISMOLOGÍA	
3	DGAR	Carpio Fernández Josemanuel Fernando	CAS	Hidrogeólogo	
4	DGAR	Quispe Yanapa Baclimer	CAS	Analista en Hidrogeología	
5	DRME	VALENCIA MIRAVAL, CARLOS EDUARDO	CAS	ASISTENTE	
6	DGR	Cervantes Garate, John Eduardo	CAS	Geólogo regional	
7	DGR	Coba Palomino, Luis Alfredo	CAS	Geólogo regional	
8	DGR	Nole Valdez, Maryuri	CAS	Geólogo regional	
9	DGR	Quilca Huanca, Anthony Alex	CAS	Geólogo regional	
10	DGR	Rodriguez Mejia, Rildo	CAP	Geólogo regional	
Inicio / FIN			10	22/03/2024	29/03/2024

Resumen de Tipo de Conectividad por Dirección

PC en Domicilios

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO
1	DGAR	Núñez Juárez, Segundo Alfonso	CAP	Ingeniero IV
2	DGAR	LUQUE POMA GRISELDA OFELIA	CAS	GEÓLOGO DE PELIGROS GEOLÓGICOS II
3	DGAR	MARY CARMEN CARRASCO PEREZ	CAS	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS GEOAMBIENTALES
4	DGAR	MARIE HUARIPATA HUARIPATA	CAS	ANALISTA EN ESTUDIOS GEOAMBIENTALES
5	DGAR	Machaca Fernandez Danitza Sonia	CAP	Hidrogeólogo
6	DGAR	ZAVALA CARRIÓN, BILBERTO LUIS	CAP	JEFE DE PROYECTO
7	DRME	ACOSTA ALE, JORGE GILBERTO	CAP-P4	ASISTENTE - SIGE
8	DRME	CALDERÓN COSSIO, CÉSAR AUGUSTO	CAS	GEÓLOGO ASISTENTE
9	DRME	CARPIO RONQUILLO, MARIO FRANCISCO	CAP	
10	DRME	CASTAÑEDA SALAZAR, DAVID HUMBERTO	CAS	ASISTENTE ANAP
11	DRME	CASTELO CARDEÑOSO STHIF EBERT	CAS	ASISTENTE
12	DRME	CRUZ PAUCCARA VICENTINA	CAP	INGENIERO
13	DRME	FLORES JACOBO, ROSMERY NERY	CAS	ASISTENTE- GEOF Y COORDINADOR DE PRESUPUESTO DE LA DRME
14	DRME	FUENTES PALOMINO, JESUS	CAS	ASISTENTE
15	DRME	HUANACUNI MAMANI, DINA HILDA	CAS	GEOLOGO ASISTENTE
16	DRME	MANRIQUE GALVEZ, MARIA DEL CARMEN	CAP	RESPONSABLE- GLI
17	DRME	MONTES VILLALOBOS, LUZ MARÍA	CAS	ASISTENTE DE GEOLOGÍA

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO
18	DRME	OSCCO BARRIENTOS, SANTOS ENRIQUE	CAS	ASISTENTE ANAP
19	DRME	OTERO AGUILAR JOEL		ESPECIALISTA
20	DRME	TORRES BAZAN, VICTOR RAÚL	CAS	GEÓLOGO EXPLORADOR
21	DGR	Ccallo Morocco, Walter	CAS	Geólogo regional
22	DGR	Cereceda Quintanilla, Cristina	CAP	Geólogo regional
23	DGR	Cueva Tintaya, Eber	CAS	Geólogo regional
24	DGR	Fabian Quispe, Claudia Tiffany	CAS	Geólogo regional
25	DGR	La Torre Borda, Oswaldo O.	CAS	Geólogo regional
26	DGR	Ramos Cabrera, Willy	CAS	Geólogo regional
27	DGR	Rojas Pezo, Lynda	CAS	Geólogo regional
28	DGR	Soana Condori, Jovita	CAS	Geólogo regional
29	DGR	Soberon Ortiz, Dante	CAS	Geólogo regional
30	DGR	Sucapuca Goyzueta, Carmen Juli	CAS	Geólogo regional
31	DGR	Torres Gonzales, Daniel Enrique	CAS	Geólogo regional
32	DGR	Trinidad Aranciaga, Ines	CAS	Geólogo regional
33	DGR	Yovana Mamani, Pachari Yuly	CAS	Geólogo regional

Inicio / FIN

33

01/04/2024

21/04/2024

Resumen de Tipo de Conectividad por Dirección

CITRIX

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO
1	DDV	Poccori, Silvina	CAP	Especialista Administrativo
2	DDV	Davila, Guillermo	CAP	Supervisor de Derecho de Vigencia y Penalidad
3	DDV	Tamata, Mabel	CAP	Abogada
4	DDV	Garcia, Luis	CAS	Especialista legal en administración de pagos
5	DDV	Tumialan, Ana	CAS	Abogada
6	DDV	Murillo, Jhordi	CAS	Analista Legal en Administración de Pagos
7	DDV	Aguilar, Paola	CAS	Analista Legal en Administración de Pagos
8	DDV	Sanchez, Pedro	CAS	Especialista en derecho y procedimiento administrativo
9	DDV	Preguntegui, Juan	CAS	Analista
10	DDV	Gomez, Maria	CAS	Analista en gestión de información de pagos
11	DDV	Polanco, Ninoshka	Autónomo	Apoyo legal
12	DDV	Jaen, Cristina	Autónomo	Apoyo legal
13	DDV	Espinoza, Cristina	Autónomo	Apoyo legal
14	DDV	Torres, Luis	Autónomo	Apoyo legal
15	DDV	Sandoval, Shirley	Practicante	Apoyo legal
16	DDV	Galecio, Angela	Practicante	Apoyo legal
17	DDV	Mejia, Ximena	Autónomo	Apoyo administrativo

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO
18	DDV	AUTONOMO 1	Autónomo	Apoyo legal
19	DDV	AUTONOMO 1	Autónomo	Apoyo legal
20	DCM	Gladys Arimborgo Arrieta	CAP	Secretaría
21	DCM-UTO	Víctor Moreno Alvarez	CAS	Ingeniero Informante
22	DCM-UTO	Edgar Ramal Ludeña	CAS	Ingeniero Informante
23	DCM-UTO	Carlos Trelles Rondoy	CAS	Ingeniero Informante
24	DCM-UTO	Juan Carlos Jurado Kanashiro	CAS	Ingeniero Informante
25	DCM-UTO	Joselyne Vanessa Espichan Lévano	CAS	Ingeniero Informante
26	DCM-UTO	Bladimir Córdova Altamirano	CAS	Asistente técnico
27	DCM-UTO	Gabriela Mistral Riveros Mendoza	CAS	Ingeniero Informante
28	DCM-UTO	Rolando Godofredo Lapa Yauri	CAS	Bachiller
29	DCM-UTN	Edílberto Lobatón Montoya	CAS	Abogado informante
30	DCM-UTN	Alberto Castillo Neyra	CAP	Abogado informante
31	DCM-UTN	Kelly Salcedo Campos	CAS	Abogado informante
32	DCM-UTN	Danissa Cruz Fernández	CAS	Abogado informante
33	DCM-UTN	Luz Guerra Avila	CAS	Abogado informante
34	DCM-UTN	Evelin de los Santos Castilla	CAS	Abogado informante

Resumen de Tipo de Conectividad por Dirección

CITRIX

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO
35	DCM-UTN	Sharylyn Montalvo Andrade	CAS	Abogado informante
36	DCM-UTN	Irina Ramirez Albornoz	CAS	Abogado informante
37	DCM-UTN	Renzo Aldair Sara Aiquipa	CAS	Abogado informante
38	DCM-UTN	Rosario Coaguila Moncca	CAS	Asistente legal
39	DCM-UTN	Marcia Lucia Rodríguez Silva	CAS	Asistente legal
40	DCM-UTN	Sonia Rosales Robles	CAS	Asistente legal
41	DCM-UTN	Julio César Corrales Rubio	CAS	Abogado informante
42	DCM-UTN	Luis Antonio Mendoza Huacho	Practicante	Practicante
43	DCM-UTN	Alanis Cano Torres	Practicante	Practicante
44	DCM-UTN	Gabriela del Pilar Mariluz Ruiz	Practicante	Practicante
45	DCM-UTN	Fara Daniela Purihuan Cabillas	Practicante	Practicante
46	DCM-UTN	Fiorella Alesandra Ramirez Mendoza	Practicante	Practicante
47	DGAR	CHOQUENAIRA GARATE GUISELA	CAS	ESPECIALISTA
48	DGAR	JULIO CESAR LARA CALDERON	CAS	ANALISTA

ITEM	UNIDAD ORGANICA	APELLIDOS Y NOMBRES	CONDICION LABORAL	CARGO
49	DGAR	PALOMINO TACURI ANDERSON RAFAEL	CAS	ANALISTA EN NEOTECTONICA Y PALEOSISMOLOGIA
50	DGAR	GARCÍA FERNANDEZ BACA BRIANT	CAS	ASISTENTE EN NEOTECTÓNICA
51	DGAR	BENAVENTE ESCÓBAR CARLOS LENIN	CAS	EXPERTO EN NEOTECTÓNICA Y PELIGROS GEOLÓGICOS
52	DGAR	OCHOA ZUBIATE MAGDIE BELTZADIT	CAS	ESPECIALISTA EN MOVIMIENTOS EN MASA
53	DGAR	ALBINEZ BACA LUIS ANGEL	CAS	ESPECIALISTA EN MOVIMIENTOS EN MASA
54	DGAR	Moreno Herrera Jose Luis	CAS	Asistente en Hidrogeología
55	DGAR	BECERRA VÁSQUEZ, IVAN HAGLER	CAS	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS GEOAMBIENTALES
56	DRME	AGURTO CORNEJO, ALEX FRANK	CAS	GEÓLOGO ASISTENTE
57	DRME	ARCOS ALARCON, FREDY ENRIQUE	CAS	ESPECIALISTA
58	DRME	BOULANGGER RONDOY, ELMER	CAS	INGENIERO GEÓLOGO ESPECIALISTA EN ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
59	DRME	CALLA PILCO, DARWIN EDGARDO	CAS	ASISTENTE
60	DRME	RODRIGUEZ MORANTE, ITALO PHOL	CAP-P3	RESPONSABLE- SIGE

Inicio / FIN

60

22/04/2024

29/04/2024

Segunda Fase

Contrataciones para adecuaciones y traslados

Adecuación de Almacén de Muestras y Archivo de la UADA

Adecuación	Plazo	Inicio	Fin
Primera Etapa: Adecuación de almacén de muestras	11 días	25/03/2024	04/04/2024
Segunda Etapa: Adecuación de archivo de la UADA	10 días	09/04/2024	18/04/2024
Tercera Etapa: Habilitación de conexiones eléctricas y redes	07 días	05/04/2024	11/04/2024

Contrataciones para adecuaciones y traslados

Traslado de Almacén de Muestras y Archivo de la UADA

Traslados	Plazos	Inicio	Fin
Primera Etapa: Traslado de muestras	4 días	05/04/2024	08/04/2024
Segunda Etapa: Instalación de rieles y traslado de archivo de la UADA	4 días	19/04/2024	22/04/2024
Tercera Etapa: Traslado de cámaras y aires acondicionados	7 días	12/04/2024	18/04/2024


Tercera Fase

Reubicación de Trabajadores

Etapa	Descripción	Inicio	Fin
Primera	Reubicación de la UL y UP	29/04/2024	03/05/2024
Segunda	Reubicación de la Dirección de Catastro Minero y DV	06/04/2024	10/05/2024
Tercera	Reubicación de la UADA y Dirección de Concesiones	13/05/2024	17/05/2024

Resumen reubicación de Trabajadores

Sede Lenguaje en las oficinas de la Sede de Canadá

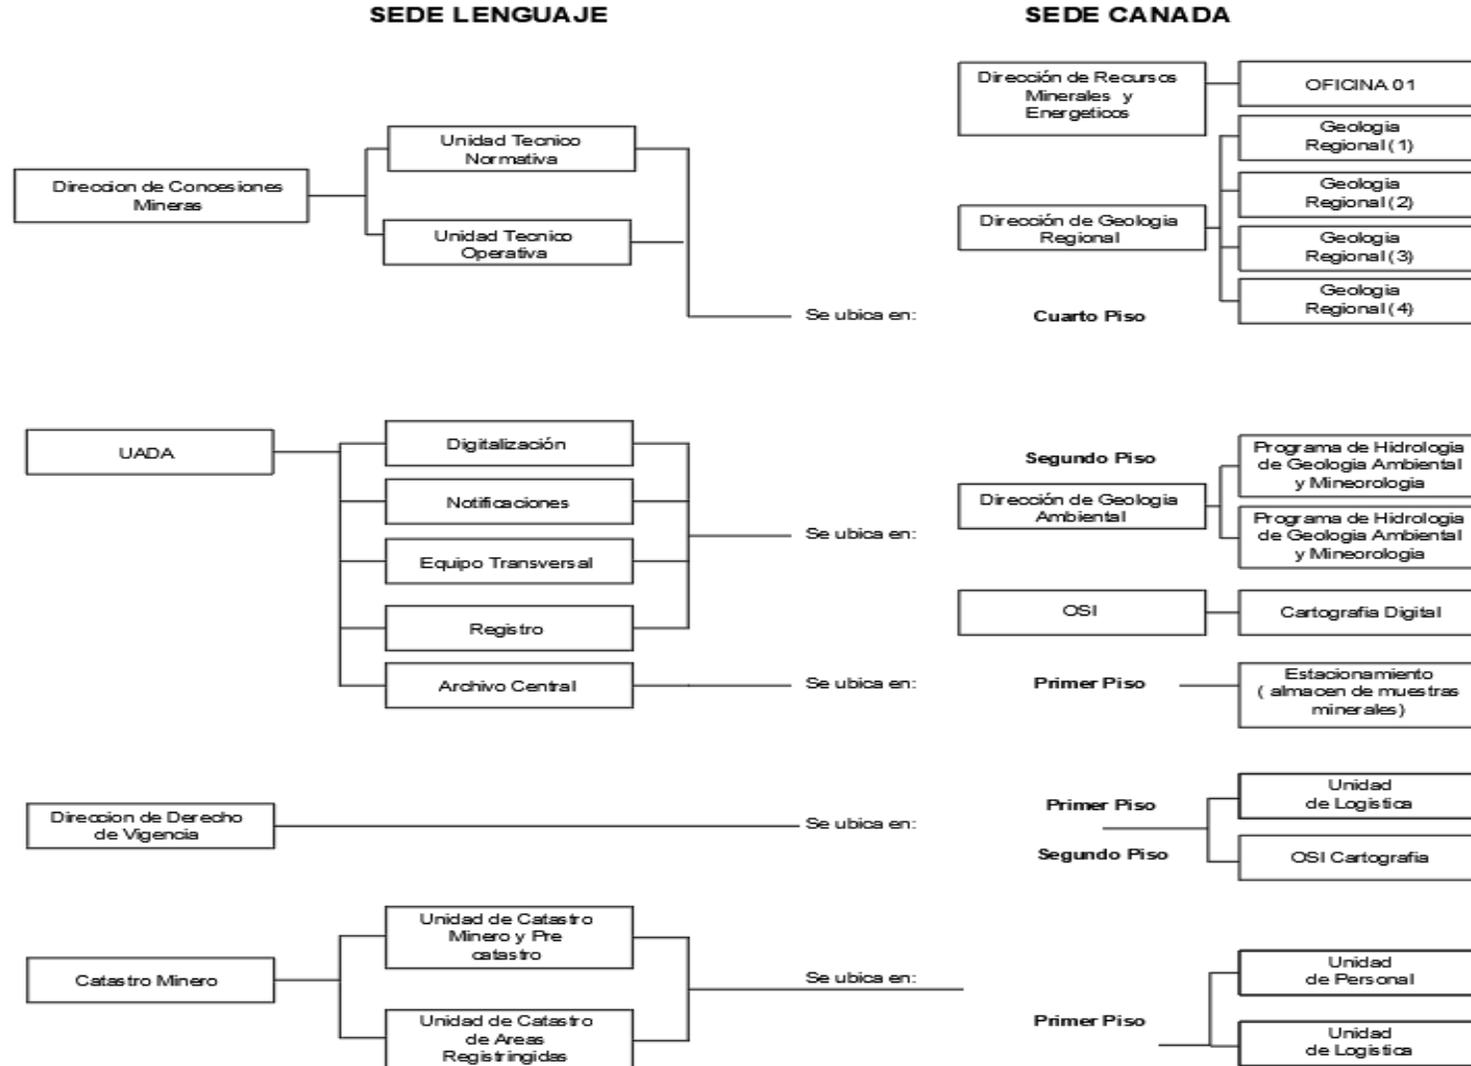

Resumen reubicación de Trabajadores


Sede Canadá

SEDE CANADÁ



Resumen reubicación de Trabajadores

Sede Canadá a las Oficinas de la Sede de Cachay

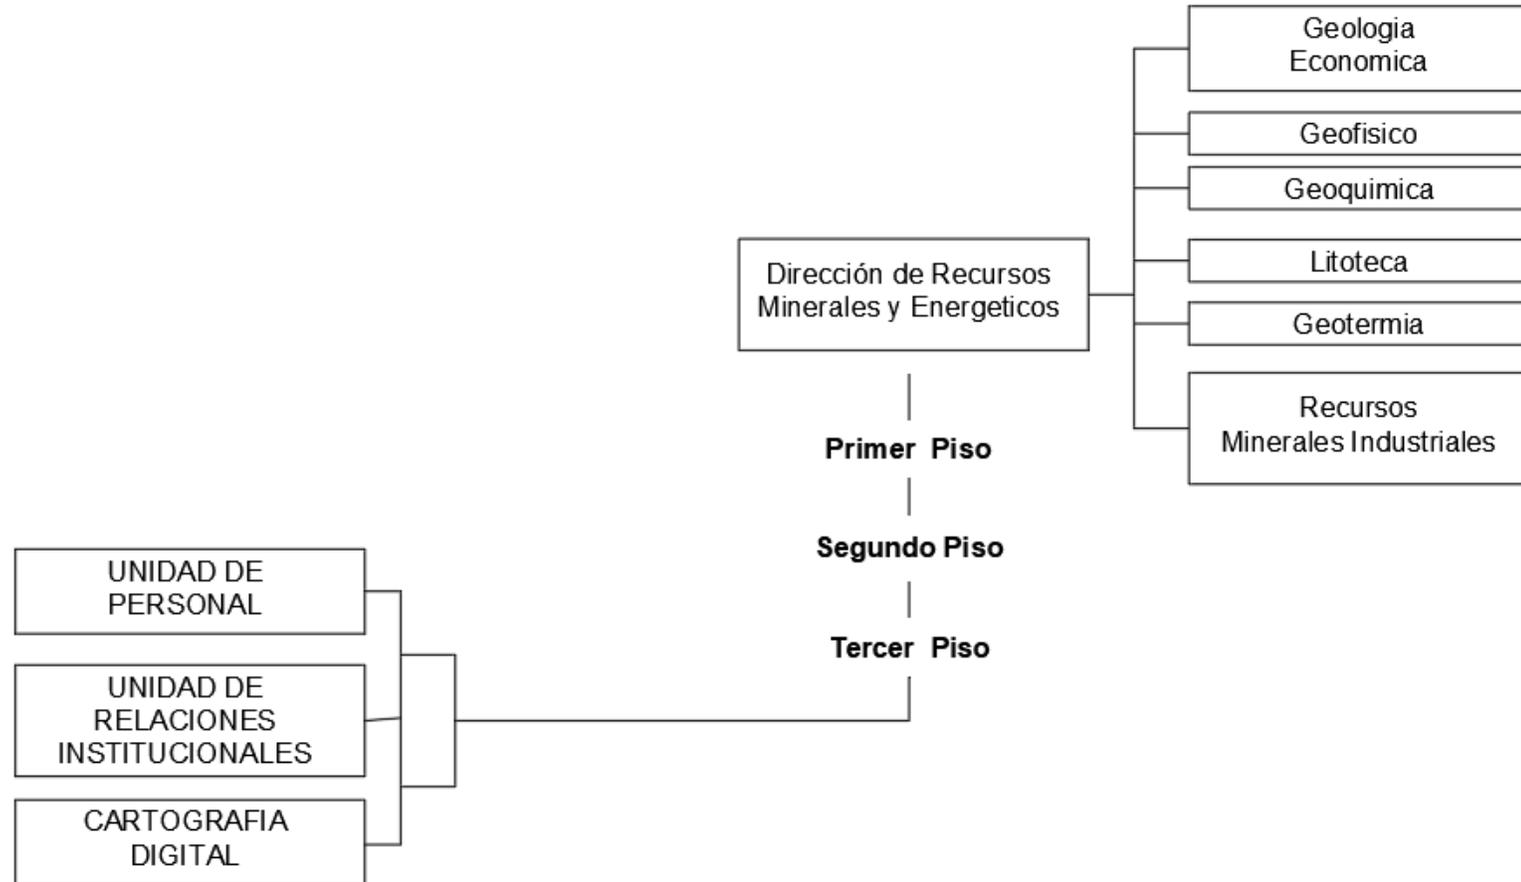


Reubicación de Trabajadores en el Primer Piso de la Sede Canadá

Catastro y Derecho de Vigencia



TOTAL DE POSICIONES ASIGNADAS

CATASTRO MINERO	26
DERECHO DE VIGENCIA	6

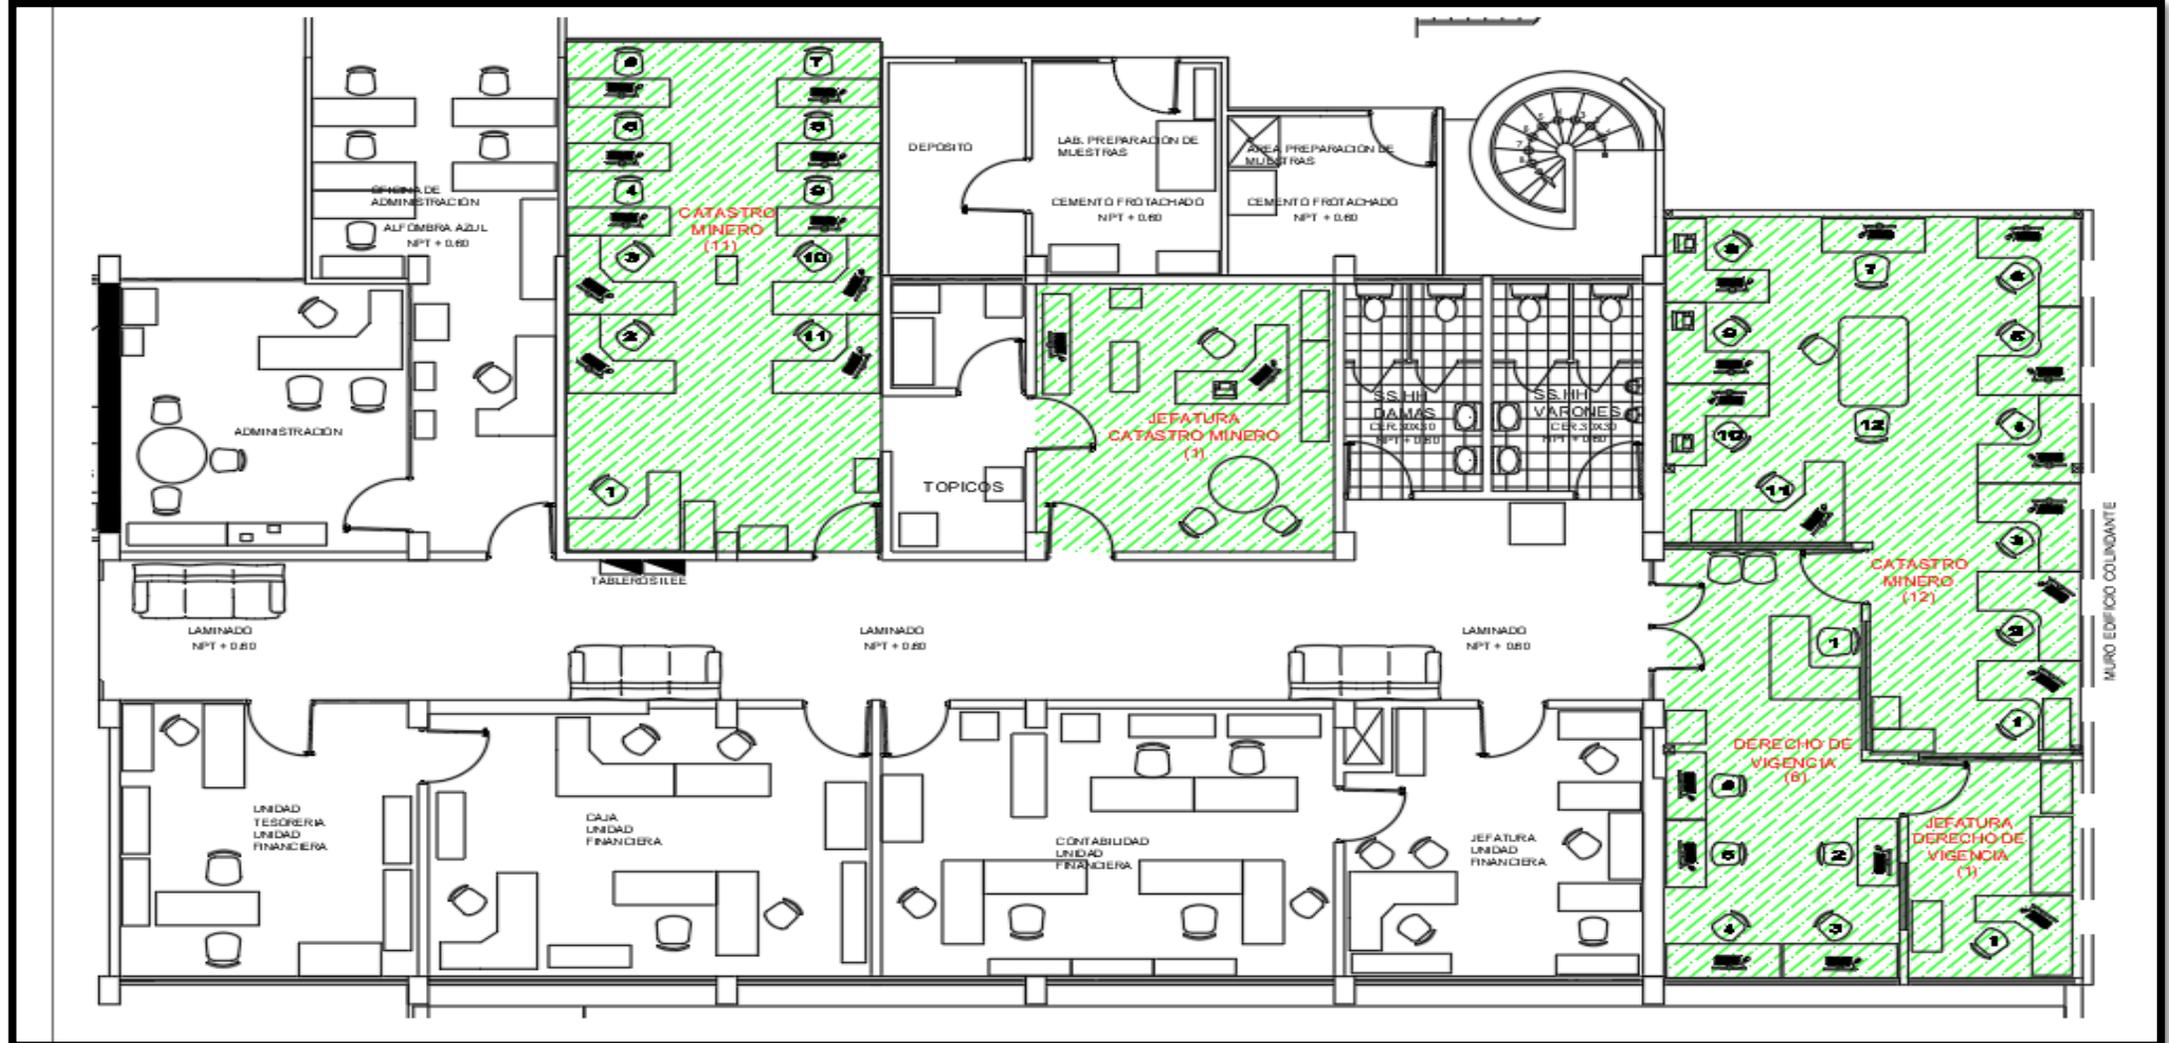


Reubicación de Trabajadores en el Primer Piso de la Sede Canadá

UADA



TOTAL DE POSICIONES ASIGNADAS

UNIDAD LOGÍSTICA	04
------------------	----

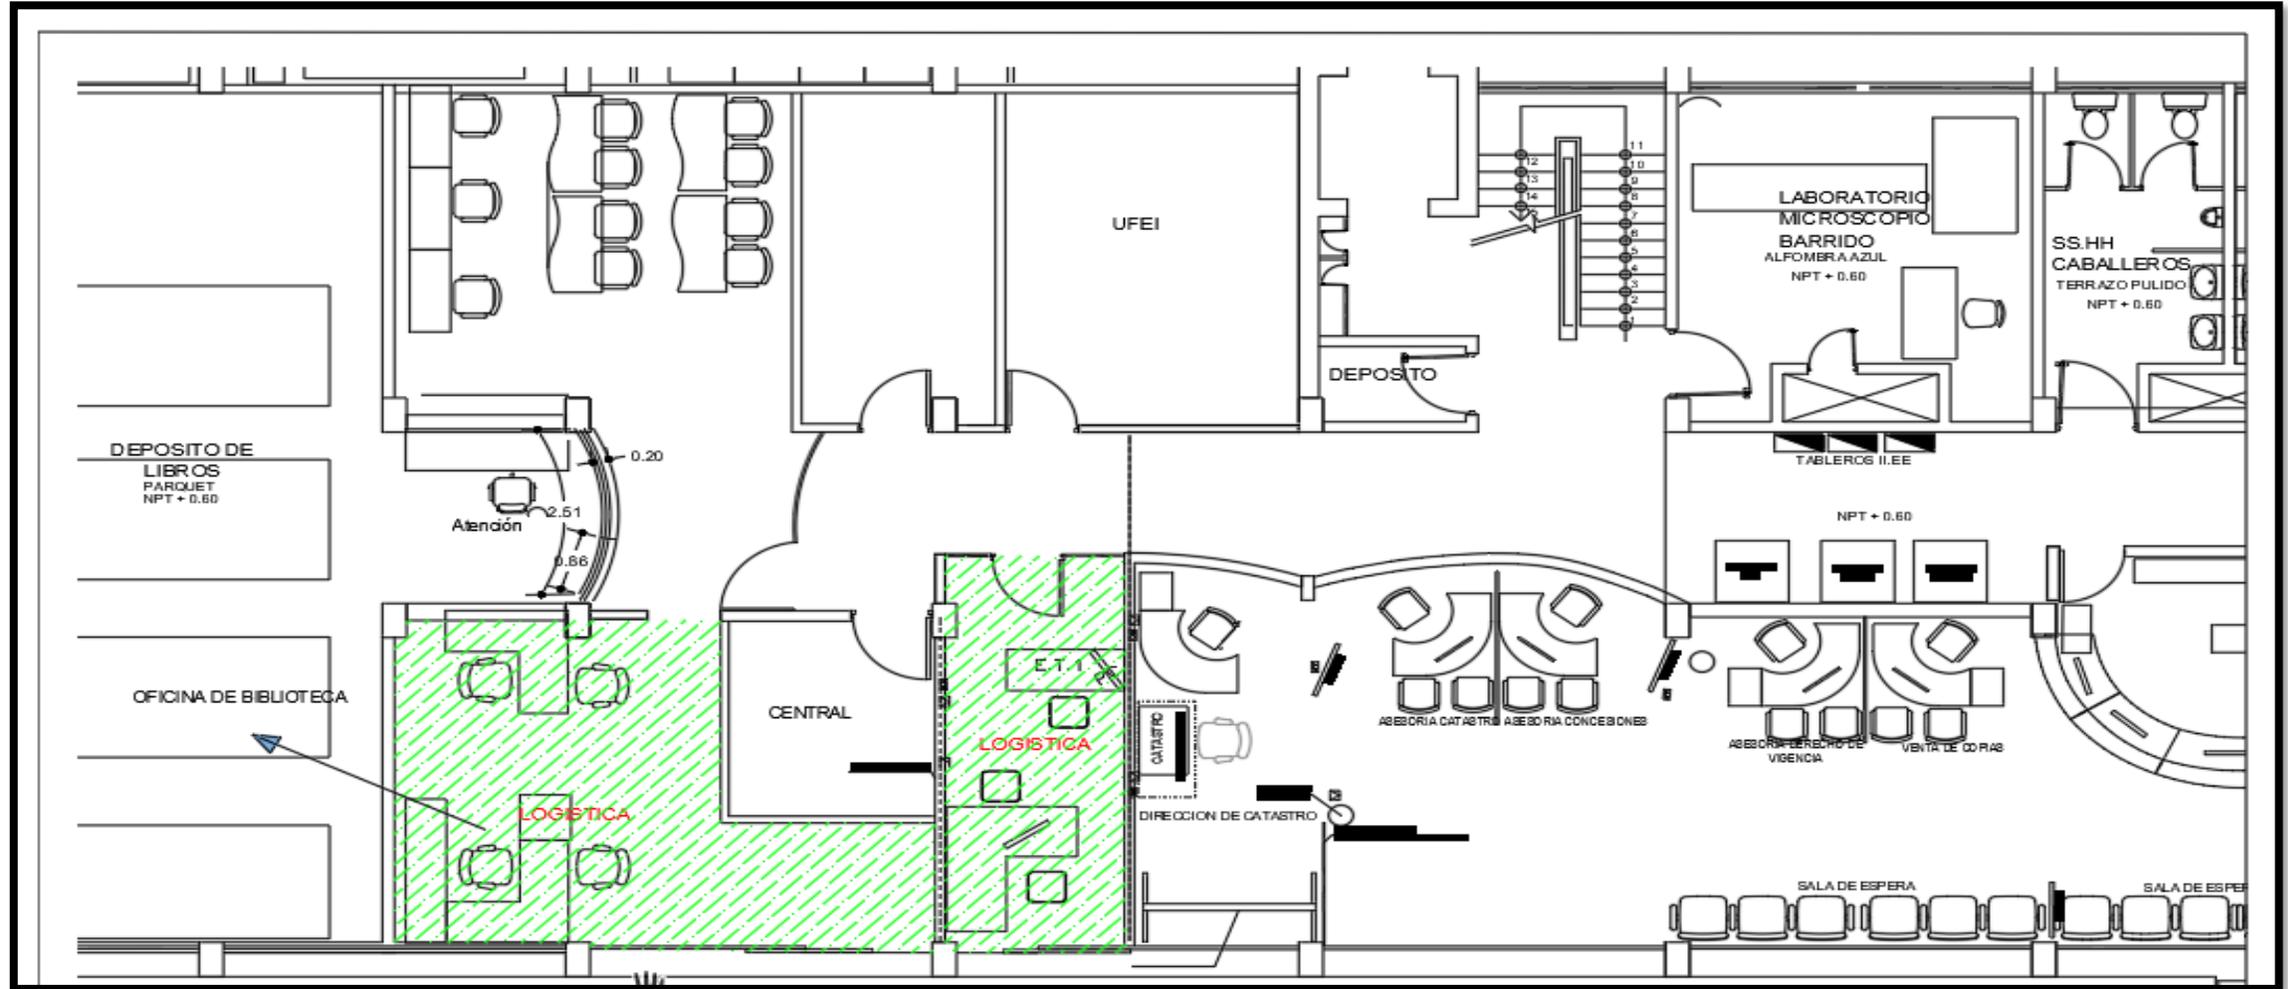


Reubicación de Trabajadores en el Segundo Piso de la Sede Canadá

UADA y Unidad de Logística



TOTAL DE POSICIONES ASIGNADAS

UNIDAD DE LOGISTICA	13
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	22

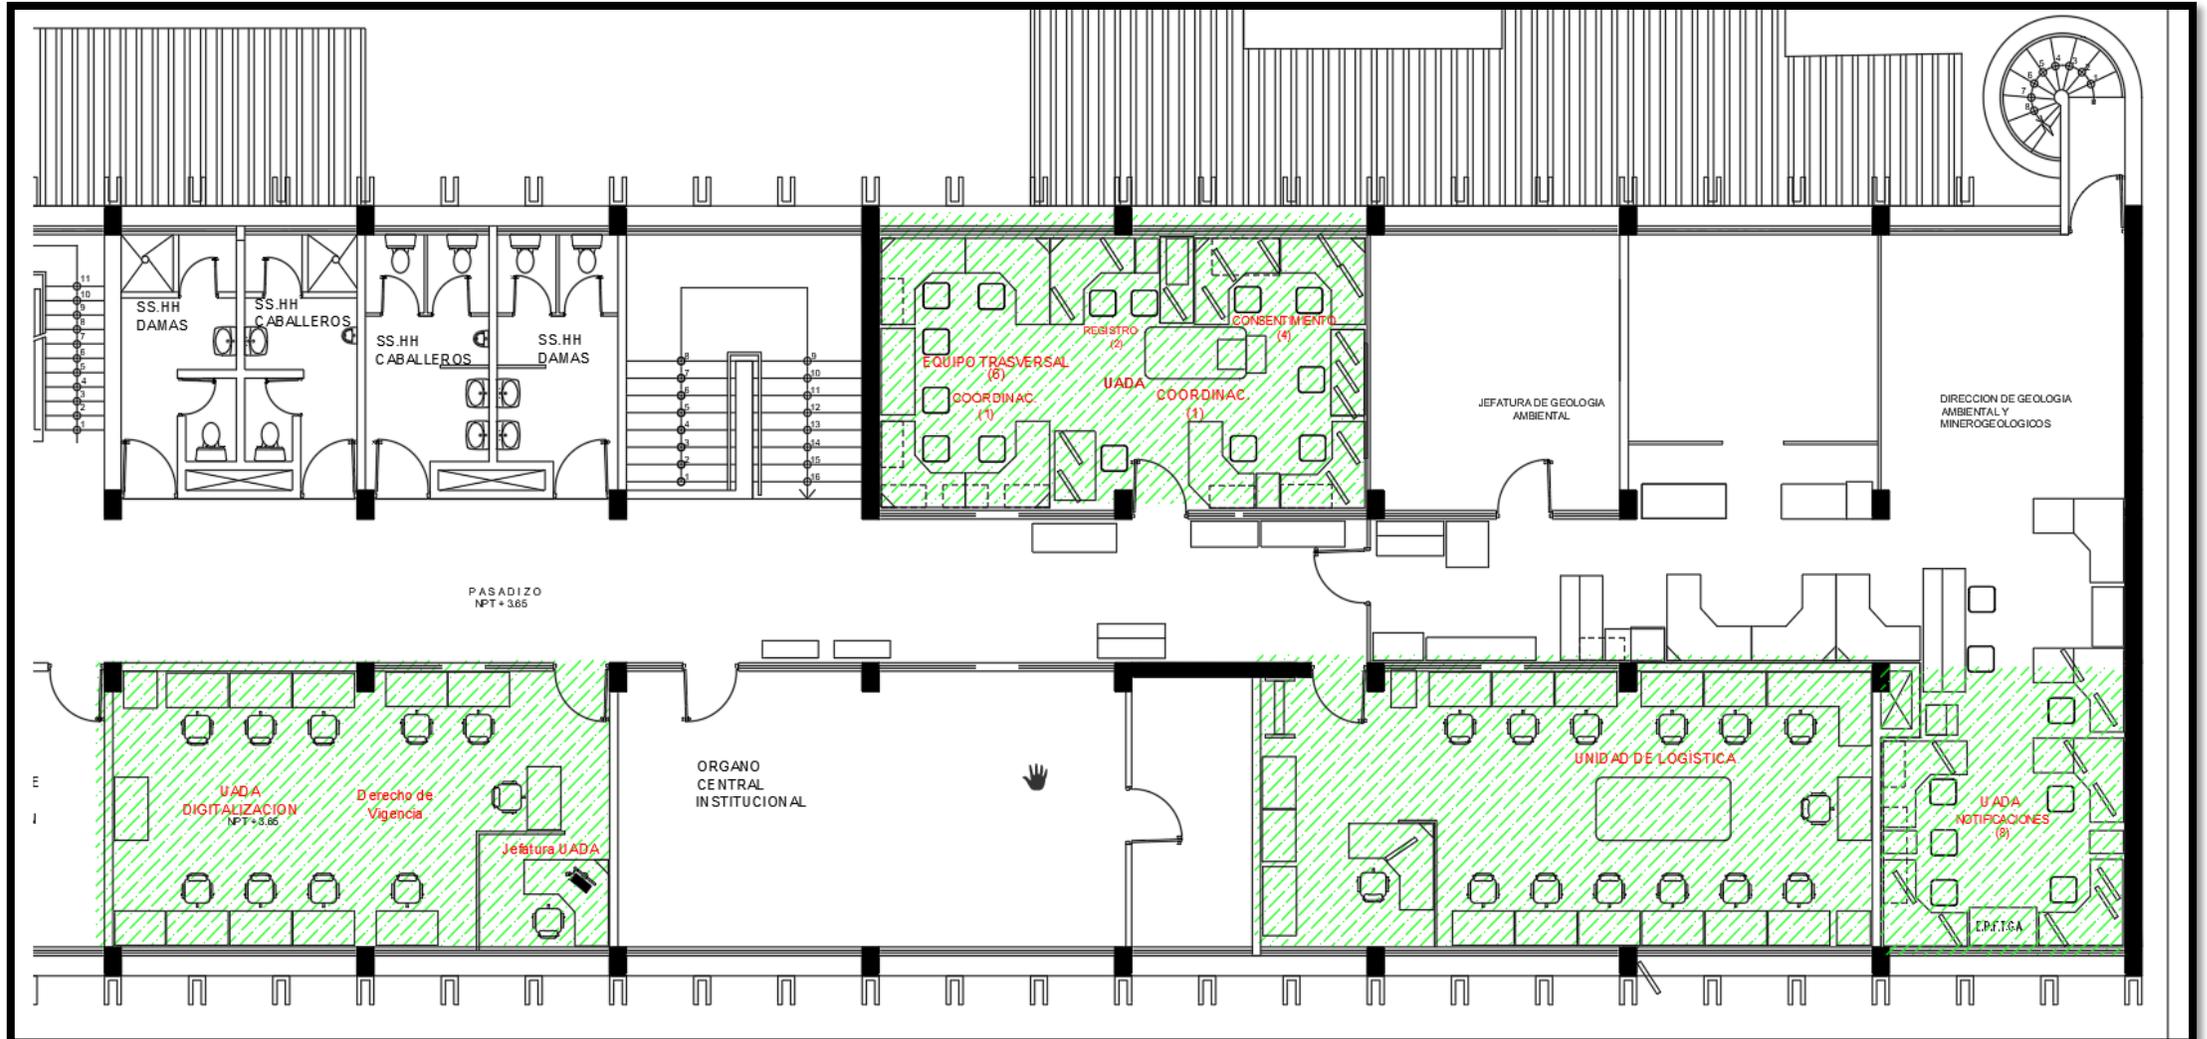


Reubicación de Trabajadores en el Cuarto Piso de la Sede Canadá

UADA, Concesiones y Derecho de Vigencia




TOTAL DE POSICIONES ASIGNADAS


UACIONES MINERAS	18
UNIDAD LOGISTICA	6

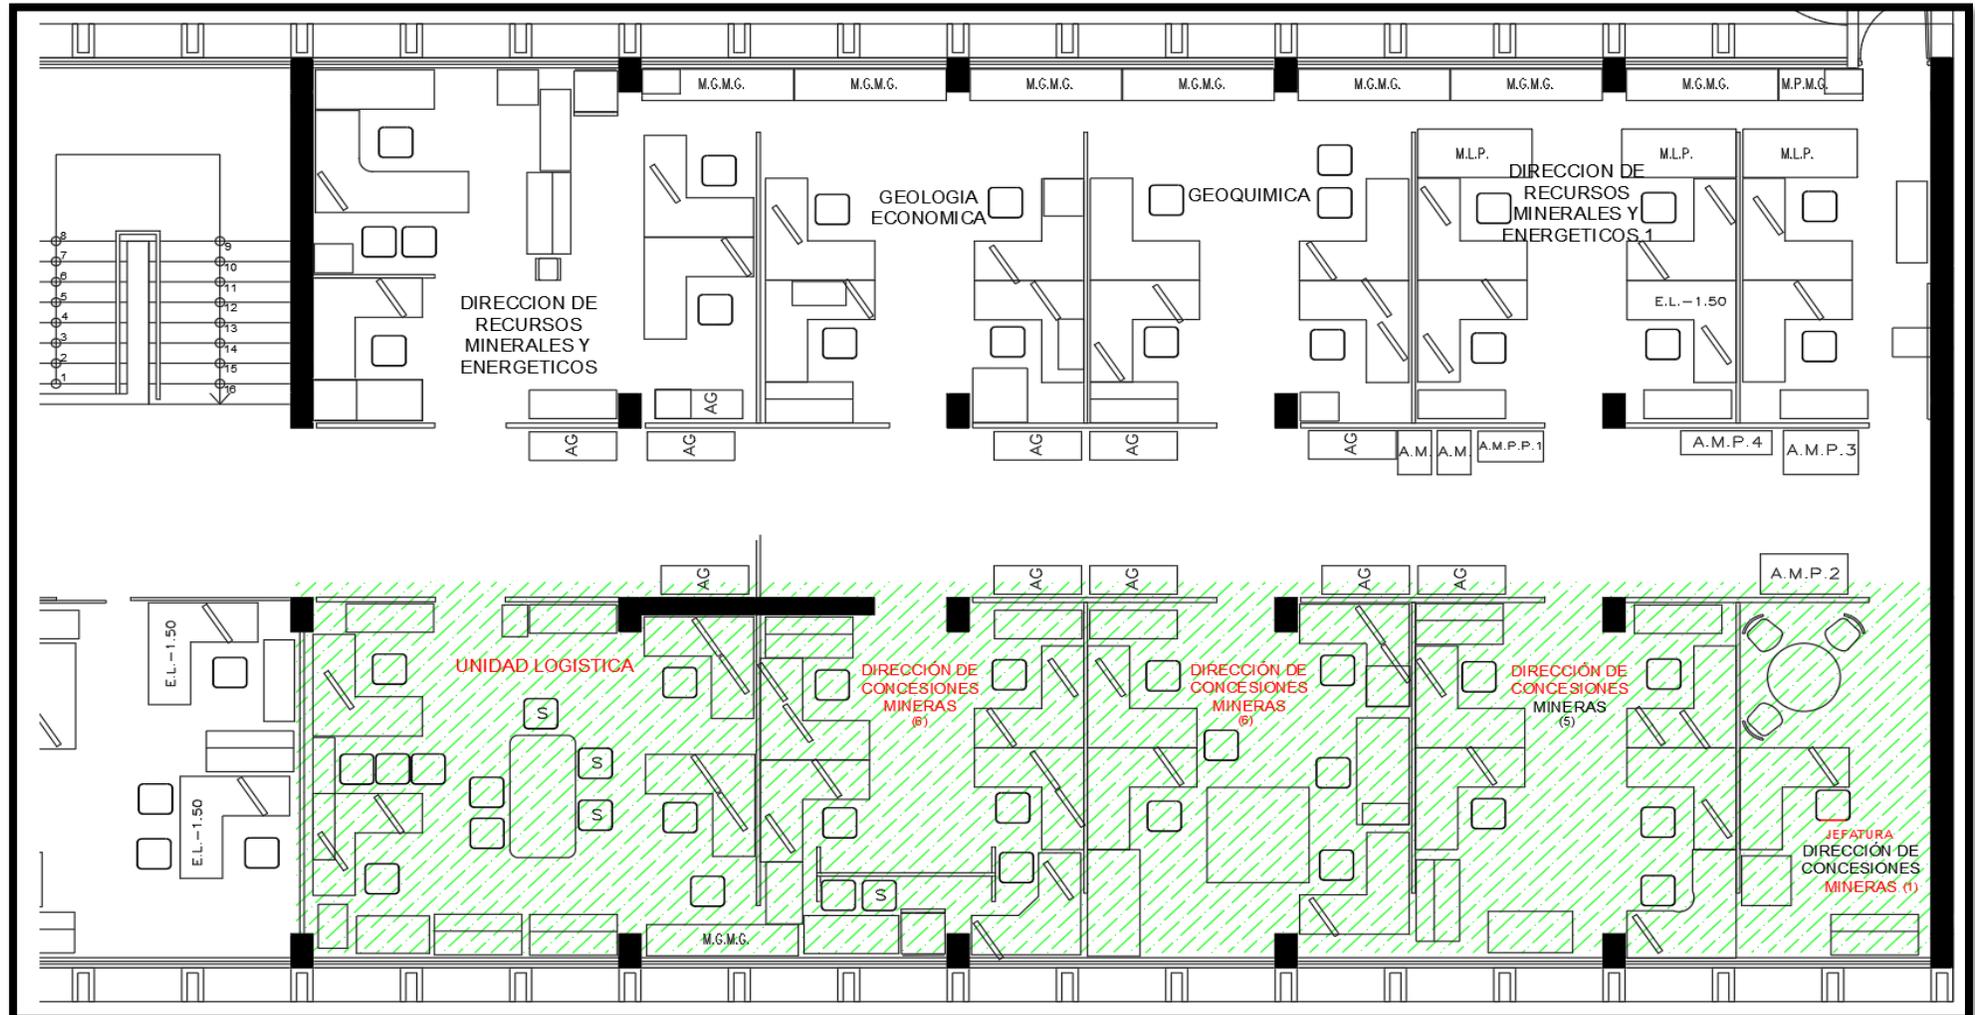

Reubicación de archivo de UADA y Almacén de Muestras Minerales

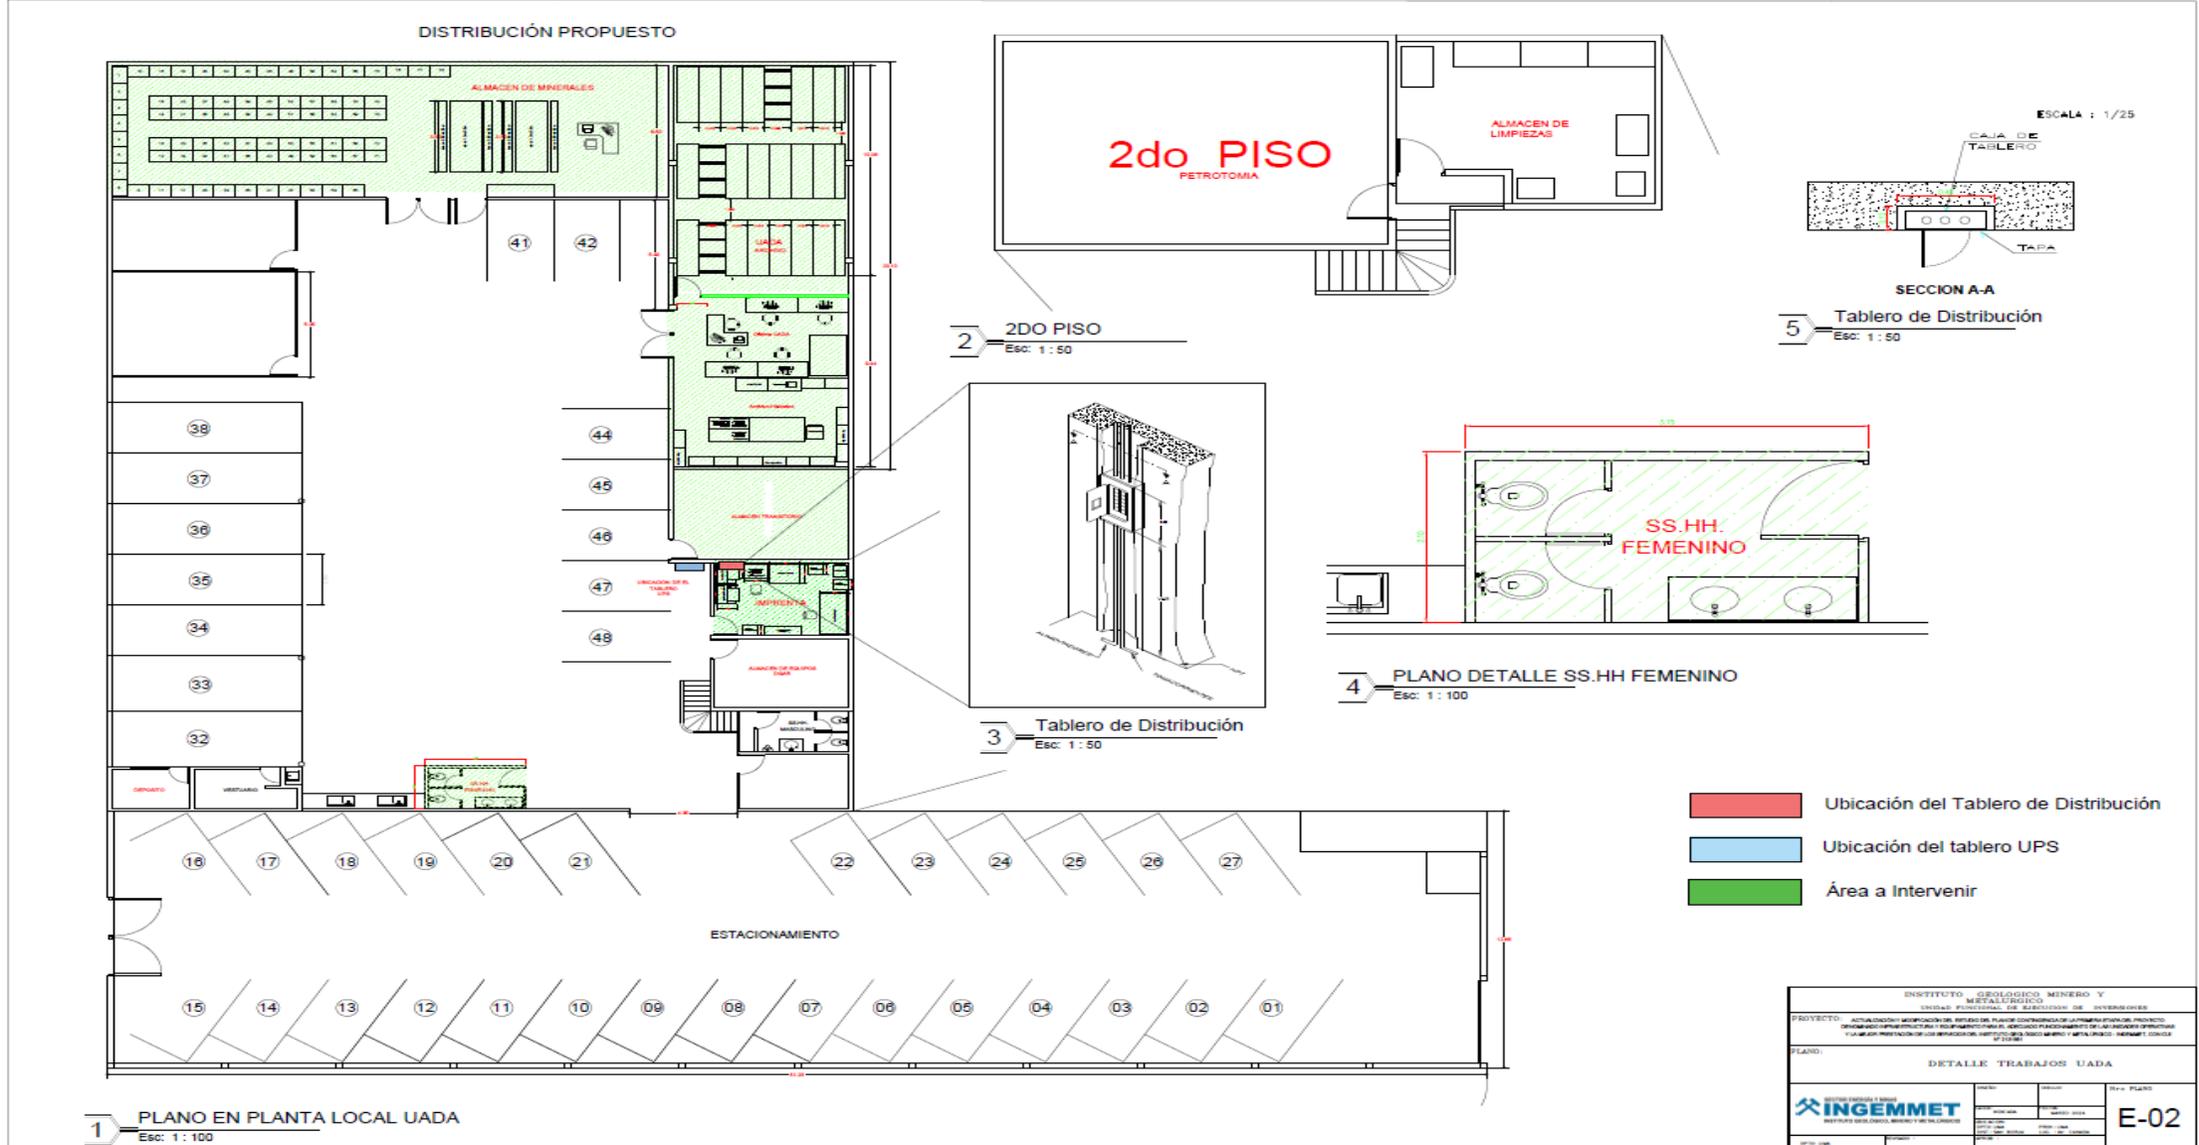


Reubicación de archivo de UADA y Almacén de Muestras Minerales

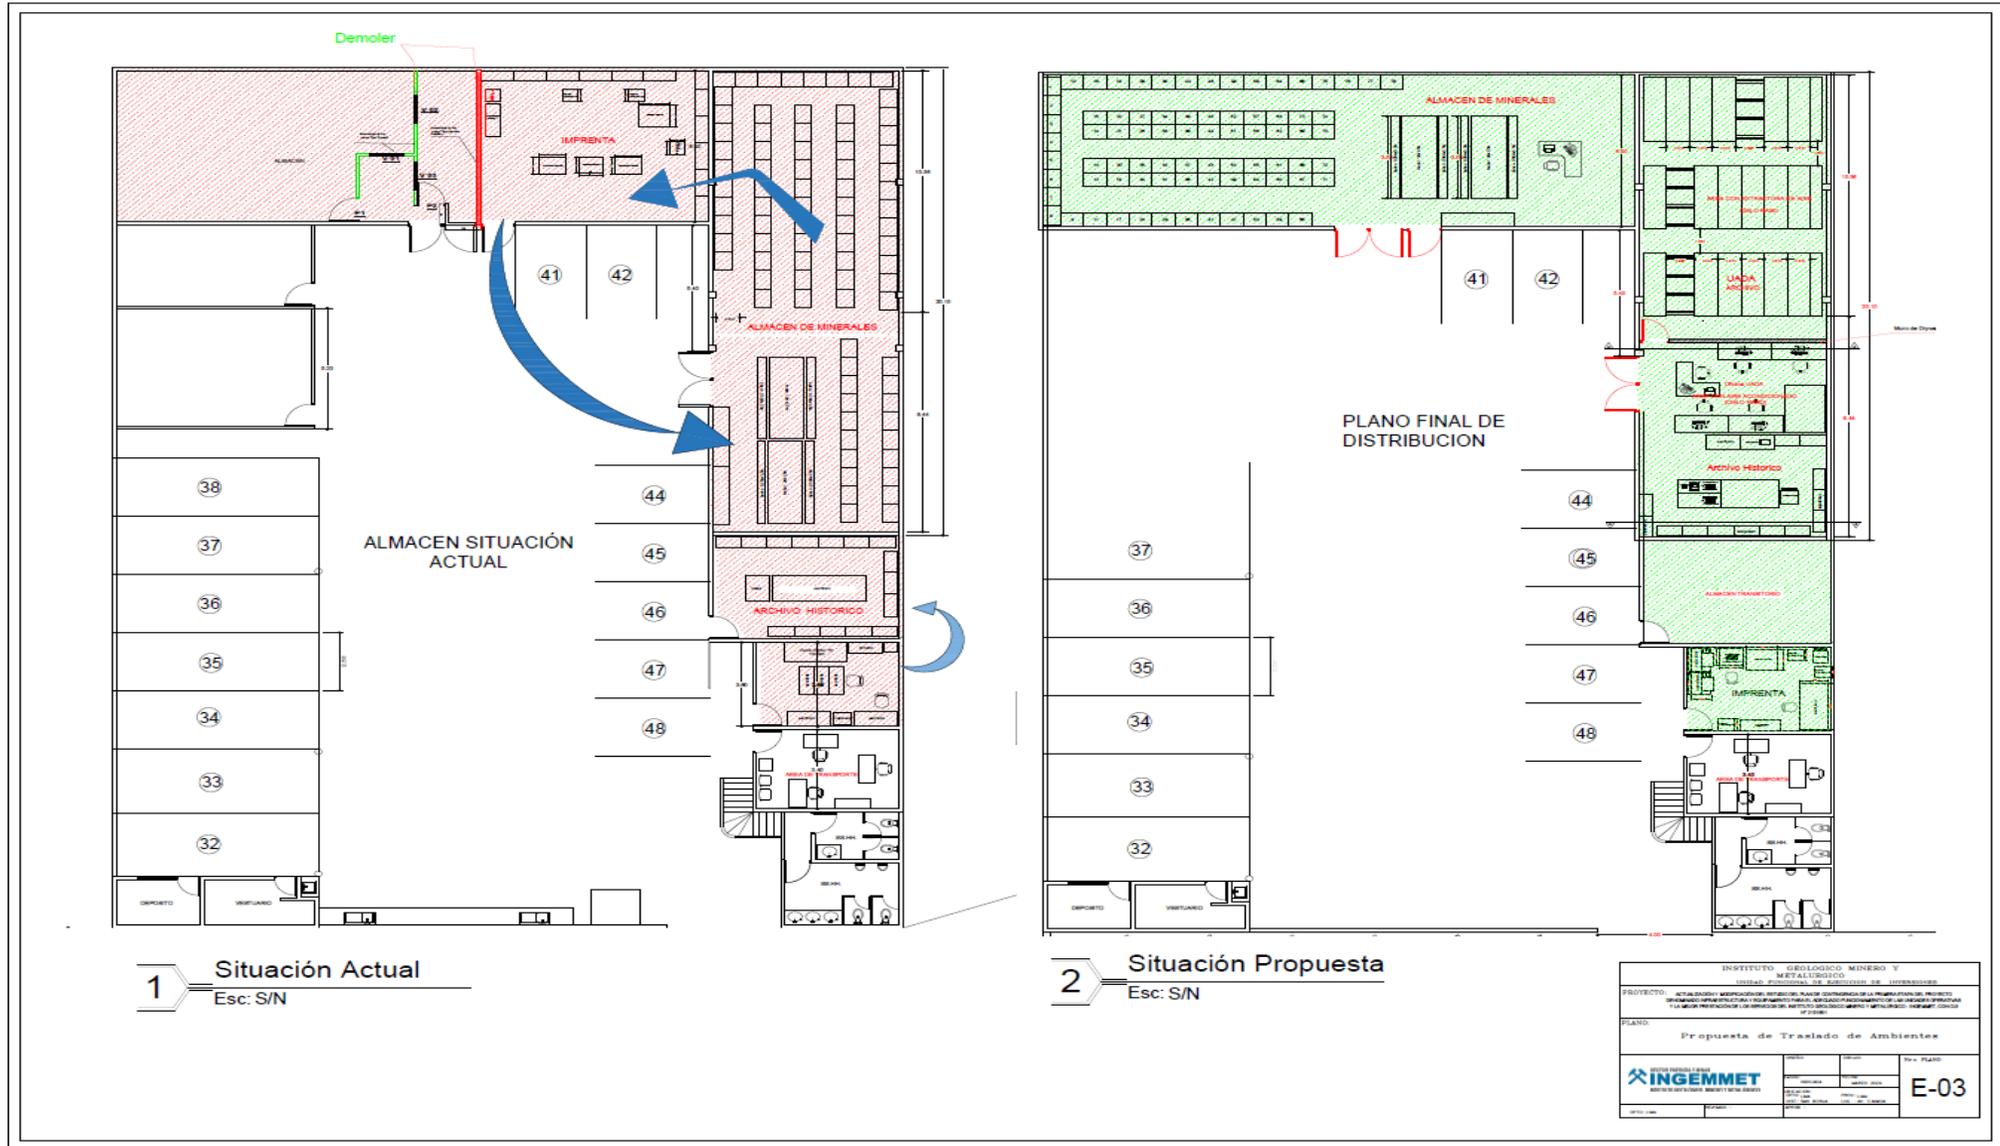

Reubicación de Trabajadores en la Sede de Cachay

Cartografía Digital, URI y Unidad de Personal

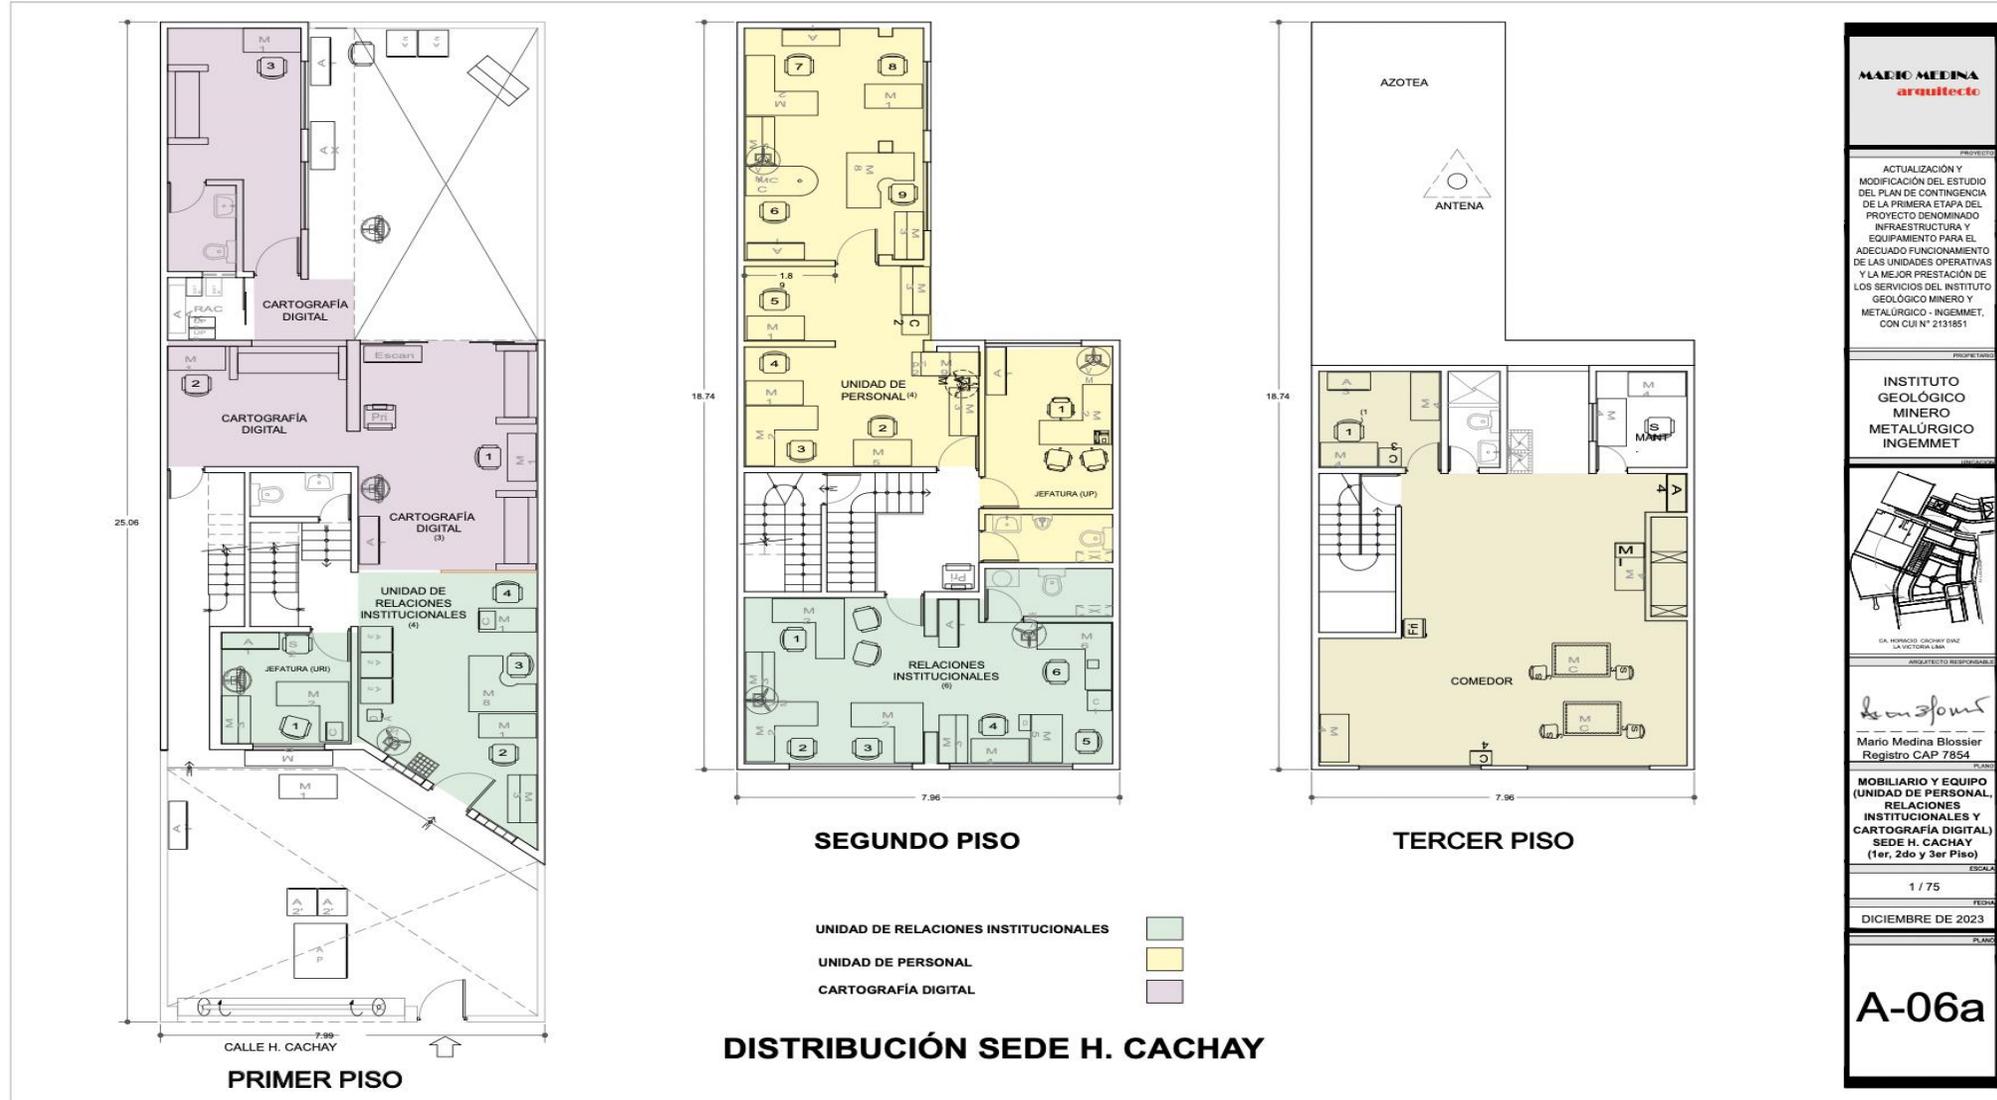

MARIO MEDINA
 arquitecto

ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y LA MEJOR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGENMET, CON CUI N° 2131851

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO INGENMET

GA. HORACIO CACHAY BAZ LA VICTORIA LIMA

Mario Medina Blossier
 Registro CAP 7854

MOBILIARIO Y EQUIPO (UNIDAD DE PERSONAL, RELACIONES INSTITUCIONALES Y CARTOGRAFÍA DIGITAL) SEDE H. CACHAY (1er, 2do y 3er Piso)

1 / 75

DICIEMBRE DE 2023

A-06a

Cuarta Etapa

**Contrataciones para desmontaje y almacenaje de los bienes y equipos de la
Sede Lenguaje**

Desmontaje y Almacenaje	Plazo	Inicio	Fin
Primera parte: Proceso de Selección	90 días	24/04/2024	23/06/2024
Segunda parte: Ejecución de desmontaje y embalaje	30 días	24/06/2024	24/07/2024
Tercera parte: Ejecución de almacenaje	24 meses	25/07/2024	25/07/2026
